



a 外8柱內縮
(2外牆邊緣為圓弧狀)

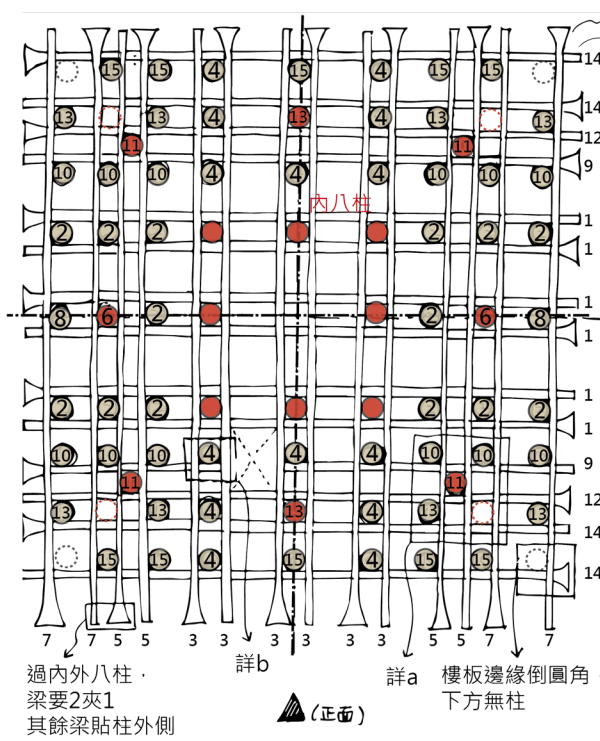

b 樓梯口不過橫樑
(斷樑處留竹節，與縱樑齊)



c 樑翹曲修正(闊竹)
(確保樑板平整度)


柱梁工序

- 01 安6支橫梁
- 02 安14支樓板下柱(左、右)
- 03 安6支縱梁
- 04 安14支樓板下柱(前、後)
- 05 安4支縱梁
- 06 安2支外八柱(左、右)
- 07 安2支縱梁
- 08 安2支樓板下柱(左、右、外)
- 09 安2支橫梁
- 10 安12支樓板下柱(前、後)
- 11 安4支外八柱(四邊)
- 12 安2支橫梁
- 13 安2支外八柱(前、後)、
8支樓板下柱(前、後)
- 14 安4支橫梁
- 15 安10支樓板下柱(前、後)

竹材分配要點



越靠中心的柱越直，
越靠外牆的柱子越彎；
正面的柱子選比較直的竹材。

縱橫梁竹勢

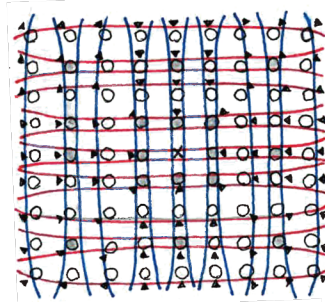

樑彎曲方向順
樓板圓弧向彎
但2夾1的樑兩
側反向彎曲
(柱才進的夾)

柱子竹勢



以中心為基準
視角正對中心時
所看到的柱是直的

